

COMUNICACIÓN INTERNA

Radicado No. 0124106763ESDEG/ MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-DIESG-PLAES

Bogotá D.C., 6 de marzo de 2024

Para: PLAES

De: Proyectos estratégicos (PLAES)

Asunto: Informe monitoreo auditorio ESDEG

Respetuosamente me permito informar a la Jefe de Planeación Estratégica, el estado de la obra de construcción del Auditorio de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", con base en el informe semanal N° 86 emitido por la interventoría de la obra, así:

Periodo del informe	22-feb-2024 al 28-feb-2024
Avance programado	96.74%
Avance de obra	94.14%
Diferencia	-2.60%

Es importante aclarar que los recursos para dicha obra se encuentran situados en el proyecto de inversión "Fortalecimiento de la infraestructura estratégica operación del Ejército Nacional", por tal motivo no es posible realizar el reporte en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP), pues la ESDEG no cuenta con el perfil de edición o visualización para poder realizarlo, sin embargo, el Departamento de Ingenieros Militares lo incluye en su reporte mensual en el módulo de seguimiento de la PIIP.



Mayor ADRIANA MARCELA VARGAS AGUILAR
Oficial Proyectos Estratégicos

Anexo: Informe semanal 86 – interventoría técnica



Elaboró: PS. Henry Quiroga
Asesor Proyectos Inversión



SEMANA N°	85	DEL	jueves, 22 de febrero de 2024			AL	miércoles, 28 de febrero de 2024		
FECHA INICIO :	23-dic-21	FECHA TERMINACION INICIAL	23-sep-22	NUEVO PLAZO DE EJECUCION		jueves, 14 de marzo de 2024			

I. IDENTIFICACION DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LAS INSTALACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL DISTRIBUIDOS ASI: FRENTE 1 - LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO DE LA ESDEGUE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU DESARROLLO QUE SERA UBICADO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - GENERAL RAFAEL REYES PRIETO CANTON NORTE

INTERVENTOR	CONSORCIO INTEROBRAS	NIT O C.C.	901.546.820-5	CONTRATO N°	295- 2021
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC- AUDITORIO 266	NIT O C.C.	901.544.439-2	CONTRATO N°	292- 2021

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACION


DESARROLLO DE LA EJECUCION POR ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA SEMANAL

N°	ITEM DE PAG.	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	86
							CANT.
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO							
5.1	EC-5.1	ACERO 60.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración)	kg	145,264.70	6,275.64	911,628,961.91	500.00
5.14	EC-5.47	VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3.000 psi (Sin Refuerzo).	M3	16.35	932,557.37	15,247,313.00	1.20
5.15	EC-5.50	COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO 4.000 psi (Sin Refuerzo).	M3	19.01	970,417.46	18,447,635.91	1.20
M-6 MAMPOSTERIA							
6.1	M-6.3	MURO EN BLOQUE N°5 Arcilla 33*23*11.5 cm. Incluye grafil 5 mm.Anclajes perforación y adhesivo epoxico	M2	1,607.90	57,644.51	92,686,607.63	40.00
6.2	M-6.35	MURO LADRILLO FACHADA Prensado Macizo GRAN FORMATO TIERRA (39 x 11,5 x 5.5 cm.) Arcilla (Incluye grafil 5 mm.)Anclajes perforación y adhesivo epoxico	M2	972.64	224,488.42	218,346,416.83	100.00
H-7B RED CONTRAINCENDIOS							
8.10	H-7B.3	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO NEGRO 2" SCH 40	M	117.00	64,805.53	7,582,247.01	50.00
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS							
9.14	IE-8.159	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 3/4".	M	203.00	5,871.99	1,192,013.97	50.00
9.17	IE-8.165	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4".	M	962.06	10,424.37	10,028,869.40	200.00
PR-9 PAÑETES Y RESANES							
10.1	PR-9.1	PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (Incluye filis y dilataciones).	M2	2,525.00	22,947.23	57,941,755.75	350.00
CB-10 CUBIERTAS							
11.1	CB-10.2	PERFILES TUBULARES ACERO ASTM A-500 Grado C (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	kg	98,654.55	14,310.85	1,411,830,529.40	200.00
11.2	CB-10.42	PERFIL ACESCO PHR C fy= 3515 kg/cm² CALIBRE Y MEDIDAS SEGUN DISEÑO (Incluye soldadura E-70, 2 manos de anticorrosivo y 3 manos de esmalte)	kg	29,559.60	14,275.19	421,968,906.32	200.00
11.3	CB-10.5	ACERO 60.000 psi Templates o tirantillos y cortavientos (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	kg	3,296.71	15,364.04	50,650,784.31	800.00
11.4	CB-10.6	PLATINAS Y ANGULOS DE UNION ACERO A-572 (Incluye soldadura, pernos, anticorrosivo y esmalte + proteccion antifuego e instalacion)	kg	2,558.65	14,542.19	37,208,374.44	300.00
11.5	CB-10.20	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal. 18 d/ 0.82 mt. (Suministro e instalacion con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A), incluye sosco de hasta 4"	M	95.60	128,549.67	12,289,348.45	95.60
11.6	CB-10.161	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA SIN TRASLAPO (STANDING SEAM), STEEL TIPO S55 COSTURA METALICA, INSTALACION MEDIANTE CLIPS OCLUTOS TIPO 2, FABRICADA EN ACERO ALUMINIZADO NONASTMA 792 A2-S0 ACERO DE CALIDAD ESTRUCTURAL TIPO SQ GRADO 37 CALIBRE 24 (E=0.61MM) PRE PINTADO EN ACERIA EN PROCESO CONTINUO CON RESINAS POLIÉSTER TIPO FLEX DX30, ALISTAMIENTO TERMO ACÚSTICO EN FIBRA DE VIDRIO E=50MM ATAC 50X50, INCLUYE CLIPS STANDING SEAM CAL 22, SISTEMA DE FIJACION Y REMATES DE CUBIERTA, DISTANCIA ENTRE CORREAS 1,60 MTS	M2	2,076.50	227,873.10	473,178,492.15	1000.00

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO								
BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A.E.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO		VR. POR EJECUTAR		AVANCE DE INVERSION		
	12.087.192.295.39	SEMANA	0.00	\$	1.041.915.975.86	SEMANA	0.00%	ACUMULADO
		ACUMULADO	\$	11.045.276.319.53				91.38%

IV. PERSONAL QUE LABORA ACTUALMENTE EN LA OBRA												V. ESTADO DEL TIEMPO				
SEMANA		CONTRATISTA			INTEROBRAS			PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)					LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS			
DIA	FECHA	OPERATIVOS	ADMON	INTERVNT	VISITAS	TOTAL DIA	JUEVES	FECHA	TOTAL HR	MAÑANA AM	TARDE PM					
JUEVES	22/02/2024	46	6	4		54	JUEVES	19/02/2024	0:00			NO				
VIERNES	23/02/2024	44	6	1		48	VIERNES	19/02/2024	0:00							
SABADO	24/02/2024	44	5	1		49	SABADO	17/02/2024	0:00							
DOMINGO	25/02/2024					0	DOMINGO	18/02/2024	0:00							
LUNES	26/02/2024	37	4	2		41	LUNES	19/02/2024	0:00							
MARTES	27/02/2024	38	5	1		48	MARTES	20/02/2024	0:00							
MIERCOLES	28/02/2024	42	6	2		49	MIERCOLES	21/02/2024	0:00							
TOTAL SEMANA		253	25	11		289	TOTAL HR	0:00								

VI. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION VS PROGRAMADO)



Semana	INICIO	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fecha	29/12/2021	5/1/2022	12/01/2022	19/01/2022	26/01/2022	2/02/2022	9/02/2022	16/02/2022	23/02/2022	2/03/2022	9/03/2022	16/03/2022	23/03/2022	30/03/2022	6/04/2022	13/04/2022	20/04/2022	27/04/2022
Pro. Semanal	0.00%	0.00%	0.01%	0.24%	0.09%	0.06%	0.37%	1.21%	1.27%	1.36%	1.22%	1.27%	1.51%	1.49%	1.09%	1.06%	1.77%	0.45%
Pro. Acumulado	0.00%	0.00%	0.01%	0.25%	0.34%	0.40%	0.77%	1.98%	3.25%	4.61%	5.83%	7.10%	8.61%	10.10%	11.19%	12.25%	14.02%	14.47%
Ejec. Semanal	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.20%	0.17%	0.00%	0.41%	0.16%	0.60%	0.00%	0.00%	1.17%	2.00%	0.19%	2.16%	1.39%	
Ejec. Acumulado	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.40%	0.57%	0.57%	0.98%	1.14%	1.74%	5.49%	6.66%	7.83%	9.83%	10.02%	12.18%	13.57%	14.96%
Balance	0.00%	0.00%	-0.01%	-0.05%	0.06%	0.17%	-0.20%	-1.00%	-2.11%	-2.87%	-0.34%	-1.61%	-3.12%	-3.44%	-4.53%	-5.40%	-5.01%	-5.11%
Semana	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Fecha	4/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	25/05/2022	1/06/2022	8/06/2022	15/06/2022	22/06/2022	29/06/2022	6/07/2022	13/07/2022	20/07/2022	27/07/2022	3/08/2022	10/08/2022	17/08/2022	24/08/2022	31/08/2022
Pro. Semanal	0.43%	1.31%	0.25%	0.45%	1.07%	1.38%	1.38%	4.77%	-13.16%	2.08%	4.48%	16.88%	30.52%	0.19%	1.82%	10.35%	16.50%	
Pro. Acumulado	14.90%	16.21%	16.73%	16.98%	17.43%	18.50%	19.88%	21.26%	26.04%	12.88%	14.96%	19.44%	36.32%	66.84%	67.03%	68.85%	79.20%	95.70%
Ejec. Semanal	0.52%	0.39%	0.24%	0.25%	0.03%	0.06%	0.00%	0.19%	0.02%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ejec. Acumulado	10.88%	11.27%	11.51%	11.76%	11.79%	11.85%	11.85%	11.85%	12.04%	12.06%	12.06%	12.07%	12.06%	12.06%	12.06%	12.06%	12.06%	12.06%
Balance	-4.02%	-4.94%	-5.22%	-5.22%	-5.64%	-6.60%	-8.00%	-9.41%	-14.00%	-8.82%	-2.90%	-7.37%	-24.28%	-54.78%	-54.79%	-56.79%	-67.14%	-83.64%
Semana	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Fecha	14/12/2022	21/12/2022	28/12/2022	4/01/2023	19/04/2023	26/04/2023	3/05/2023	10/05/2023	17/05/2023	24/05/2023	31/05/2023	7/06/2023	14/06/2023	21/06/2023	28/06/2023	5/07/2023	12/07/2023	19/07/2023
Pro. Semanal	0.00%	2.50%	1.30%	3.00%	1.06%	0.99%	0.83%	1.50%	0.38%	0.43%	1.54%	2.00%	2.01%	2.05%	2.03%	1.75%	2.03%	
Pro. Acumulado	93.20%	95.70%	97.00%	100.00%	14.06%	15.05%	15.88%	17.38%	17.76%	18.19%	19.73%	21.73%	23.73%	25.74%	27.79%	29.82%	31.87%	33.60%
Ejec. Semanal	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	1.81%	1.68%	0.56%	1.38%	0.23%	0.16%	0.16%	1.09%	1.83%	1.75%	1.84%	1.54%	1.65%	
Ejec. Acumulado	12.06%	12.08%	12.08%	12.08%	15.60%	17.28%	17.84%	19.45%	19.45%	19.63%	19.79%	21.97%	23.06%	24.89%	26.64%	28.48%	30.02%	31.67%
Balance	-81.14%	-83.62%	-84.92%	-87.92%	1.54%	2.23%	1.96%	1.84%	1.69%	1.44%	0.06%	0.24%	-0.67%	-0.85%	-1.15%	-1.34%	-1.55%	-1.93%



SEMANA N°	85	DEL	jueves, 22 de febrero de 2024				AL	miércoles, 28 de febrero de 2024			
FECHA INICIO :	23-dic-21	FECHA TERMINACION INICIAL	23-sep-22		NUEVO PLAZO DE EJECUCION	jueves, 14 de marzo de 2024					

I. IDENTIFICACION DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LAS INSTALACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL DISTRIBUIDOS ASI: FRENTE 1 - LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO DE LA ESDEGUE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU DESARROLLO QUE SERA UBICADO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO CANTON NORTE

INTERVENTOR	CONSORCIO INTEROBRAS				NIT O C.C.	901.546.820-5				CONTRATO N°	295- 2021			
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC- AUDITORIO 266				NIT O C.C.	901.544.438-2				CONTRATO N°	292- 2021			

Semana	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
Fecha	26/07/2023	2/08/2023	9/08/2023	16/08/2023	23/08/2023	30/08/2023	6/09/2023	13/09/2023	20/09/2023	27/09/2023	4/10/2023	11/10/2023	18/10/2023	25/10/2023	1/11/2023	8/11/2023	15/11/2023	22/11/2023
Pro. Semanal	2.01%	1.73%	3.65%	1.65%	2.75%	3.38%	4.83%	4.52%	3.73%	3.93%	1.66%	1.41%	1.21%	0.69%	0.53%	0.53%	0.53%	0.54%
Pro. Acumulado	35.59%	37.32%	40.97%	42.62%	45.37%	48.75%	53.58%	58.10%	61.83%	65.76%	67.42%	68.83%	70.04%	70.84%	71.53%	72.07%	72.07%	73.14%
Ejec. Semanal	1.11%	1.91%	3.56%	2.14%	1.58%	2.83%	3.81%	4.53%	3.75%	3.92%	2.10%	2.31%	1.94%	1.59%	1.28%	0.82%	1.03%	0.95%
Ejec. Acumul	32.78%	34.69%	38.25%	40.39%	41.97%	44.80%	48.61%	53.14%	56.89%	60.81%	62.91%	65.22%	67.16%	68.75%	70.03%	70.85%	71.88%	72.83%
Balance	-2.81%	-2.63%	-2.72%	-2.23%	-3.40%	-3.95%	-4.97%	-4.96%	-4.94%	-4.95%	-4.51%	-3.61%	-2.88%	-2.05%	-1.50%	-1.22%	-0.19%	-0.31%

Semana	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
Fecha	29/11/2023	6/12/2023	13/12/2023	20/12/2023	27/12/2023	3/01/2024	10/01/2024	17/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	7/02/2024	14/02/2024	21/02/2024	28/02/2024
Pro. Semanal	1.01%	1.04%	1.03%	1.00%	1.01%	1.46%	1.67%	1.70%	1.86%	2.69%	3.33%	3.05%	3.34%	2.42%
Pro. Acumulado	74.15%	75.17%	76.20%	77.20%	78.21%	79.67%	81.34%	83.04%	84.90%	87.59%	89.10%	93.02%	94.32%	96.74%
Ejec. Semanal	1.07%	0.88%	0.41%	1.30%	0.91%	0.92%	0.85%	0.74%	0.00%	2.08%	1.29%	0.00%	0.00%	2.76%
Ejec. Acumul	73.90%	74.78%	75.19%	79.92%	80.83%	81.75%	82.60%	83.34%	83.34%	85.42%	86.71%	86.71%	91.38%	94.14%
Balance	-0.25%	-0.39%	-1.01%	2.72%	2.62%	2.08%	1.26%	0.30%	-1.56%	-2.17%	-2.39%	-6.31%	-2.94%	-2.60%

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1	ASPECTOS TECNICOS	ACTIVIDADES: Ejecutadas Durante la semana	OBSERVACIONES	GENERALIDADES
1		Instalación de red sistema contraincendios RCI		
2		Instalación de sistema eléctrico, instalación de tuberías cajas		
3		instalación de sistema hidrosanitario, instalación de accesorios puchs y aparatos		
4		Instalación de teja de cubierta. Primera capa.		
5		Mampostería en gran formato y bloque No. 5		
6		Aplicación de pañetes, columnetas y viguetas.		
7		Instalación de contravientos en Estructura de cubierta		
8		NOVEDADES		
9		Se presentó balance para aprobación ante la entidad contratante CENAC de Ingenieros, con solicitud de adición y p+orago del contrato. A la espera del modificatorio para poder ajustar la programación.		

10	CALIDAD	MATERIALES	EQUIPOS
12	Se rechaza concreto en obra, ya que no cumple el asentamiento solicitado. (grouting)		
13			
14			

2	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	ACTIVIDADES: Ejecutadas Durante la semana	OBSERVACIONES	GENERALIDADES
1		El contratista presenta solicitud de promoga y adición en concertación con la interventoria, se tramita ante la entidad contratante.		
2				

5	ASPECTOS SST	ACTIVIDADES: Ejecutadas Durante la semana	OBSERVACIONES	GENERALIDADES
1		Organización de Documentos de personal operativo para los respectivos ingresos.	Los ingresos a la Obra Auditorio se realizan de forma regular todas las semanas bajo unos procedimientos estandarizados, los que nos ayuda a consolidar la información pertinente para el debido ingreso.	se solicita al contratista toda la documentación (Afilaciones a seguridad social, examen medicos ocupacionales, antecedentes, cursos de alturas) luego de recibirlos es importante validar la información antes los respectivos entes para demostrar la veracidad de dicha documentación y así poder generar el ingreso pertinente al personal.
2		Actualización de formatos de ingresos a obras y los formatos de ingresos de visitas Ocaionales.	Es necesario que el contratista genere la información pertinente en los plazos estipulados, ya que la escuela de guerra también tiene unos procedimientos estrictos en fechas y horas para los ingresos.	para los ingresos a obras el contratista debe enviar la documentación anteriormente mencionada para validar que se cumplen y así poder generar en el respectivo formato el ingreso pertinente.
3		Jornada de Orden y Aseo.	Se ejecuta la actividad de Orden y Aseo en la obra, con la recolección del material de Residuos peligrosos, y con la Clasificación de los Residuos.	Es de Vital importancia mantener un orden adecuado para mitigar Accidentes y disminuir los peligros asociados a las actividades operativas.
4		Charlas y Pausas Activas	las charlas son actividades que nos ayudan a mitigar los riesgos de las Actividades, y nos ayudan a concientizar al personal del Autocuidado.	Las charlas y pausas activas se deben realizar de forma Diaria con todo el personal Operativo, y generar conciencia y educación con los autocuidados.
5		Inspecciones de Herramientas y equipos.	la SST de interventoria realiza las respectivas validaciones e inspecciones de equipo electricos utilizados en las diferentes actividades operativas.	

6	ASPECTOS AMBIENTALES	ACTIVIDADES: Ejecutadas Durante la semana	OBSERVACIONES	GENERALIDADES
1		Semana 86 (del 22 de febrero al 28 de febrero de 2024): continua el seguimiento al "Plan de Manejo Ambiental Consorcio Auditorio 266" donde las principales actividades en la semana han sido de gestión documental y mejoras en el orden y aseo de la obra.	Aún se encuentra en trámite la actualización del Plan de emergencia. Se evidencia que el componente SST ha acompañado y actualizado en obra las actividades de orden y aseo que competen al componente ambiental y SST	Una vez la contratista actualice el plan de emergencias, se incluirá en el "Plan de Manejo Ambiental Consorcio Auditorio 266". Es notable la mejoría en el orden y aseo general de la obra
2		Del Programa para el Manejo adecuado de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en obra, Interventoría revisa y autoriza la carga del PIN de Diciembre de 2023 y enero de 2024 . La contratista programa otra jornada de recolección y disposición de Residuos peligrosos para el final de la presente semana.	Se identifica la mejora en la segregación de los residuos (en especial de los residuos peligrosos) y el acopio temporal de los mismos. El contratista ha actualizado la carga del PIN hasta enero de 2024; interventoría revisa la documentación y autoriza el trámite.	Se insta al contratista a cubrir los residuos RCD con plástico (en especial los pétreos) para evitar el deterioro de las áreas adyacentes y cumplir con la normatividad al respecto
3		Se revisan las mejoras en el relativo al Programa para el manejo Integral de Residuos Sólidos, estrechamente relacionados con las actividades de orden y aseo del componente SST	Se evidencia la gestión del contratista en este programa del PMA; ha mejorado la segregación de los diferentes tipos de residuos.	Se valora en gran medida la articulación y el apoyo del contratista y de la interventoría en SST
4		Con respecto al programa de Gestión del recurso Hídrico, la contratista e interventoria estamos en espera de los resultados formales del análisis de sólidos (sedimentables y suspendidos) y en cuanto al Programa de ahorro y uso eficiente del agua, la interventoría mide el consumo semanal.	En esta semana, la maquina de corte de bloque y ladrillo ha reducido el volumen de operación de la maquina y conforme al consumo se confirma que se está operando correctamente y con un volumen de sólidos sedimentables <0,1 mil . El caudal de la última semana informada responde a Q= 1,59 lts/s confirmando el uso eficiente del recurso	En este periodo se ha reducido el consumo y el vertimiento de la maquina y se ha entendido como "normal" para las actividades técnicas y el personal en obra que en promedio las 40 personas
5		En el programa de manejo paisajístico, recurso Biótico (flora) relativo en especial al manejo de los cuatro árboles trasladados, interventoría ha enviado al CENAC el informe del tercer y último tratamiento de fertilización remitido por el contratista	Interventoría remite al CENAC la ejecución del último mantenimiento a los cuatro árboles trasladados dando cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental Auditorio 266 y a la guía para el manejo ambiental de obras civiles de las FFMM	Dos de árboles trasladados se encuentran en buen estado y fructificando; los otros dos no presentan mejoría. La cerca viva que rodea los árboles trasladados (conformada por 115 árboles Eugenia) ya tienen 1,50 m de altura
6				

CONCLUSIONES.

1
2
3

NESTOR ROJAS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA




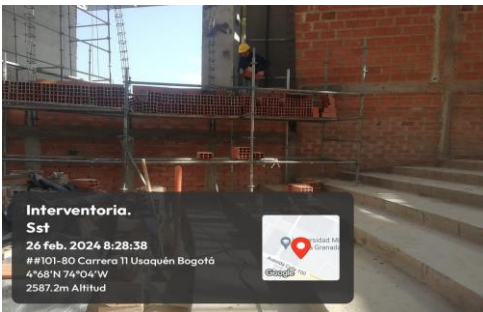


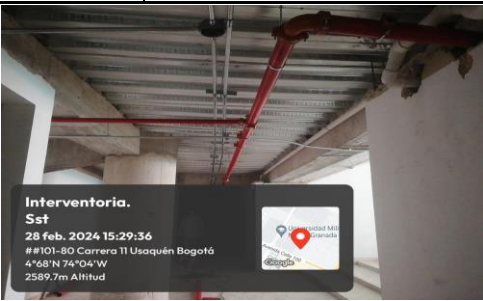
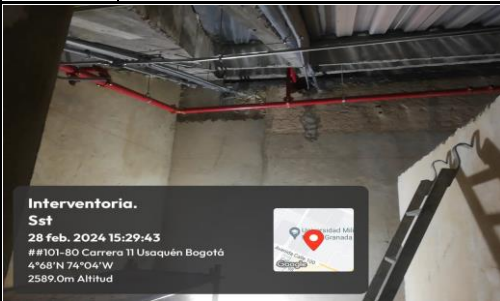






Código:	86	DEL	Versión:	jueves, 22 de febrero de 2024	Fecha de Emisión:	AL	Página:	miércoles, 28 de febrero de 2024
SEMANA N°	86	DEL	FECHA INICIO :	23 de diciembre de 2021	FECHA TERMINO :	23 de septiembre de 2022		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LAS INSTALACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL DISTRIBUIDOS ASI: FRENTE 1 - LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO DE LA ESDEGUE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU DESARROLLO QUE SERA UBICADO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO CANTON NORTE Y FRENTE II - CONSTRUCCION AULAS ESCUELA DE INFANTERIA ESINF EN EL CANTON NORTE Y FRENTE III - CONSTRUCCION DEL COMANDO PARA LA FUTAN QUE SERA UBICADO EN EL FUERTE MILITAR BUENA VISTA - GUAJIRA"							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTEROBRAS		NIT O C.C.	901.546.820-5	CONTRATO N°	295- 2021		
CONTRATISTA	CONSORCIO CENACAUDITORIO- 266		NIT O C.C.	901.544.439-2	CONTRATO N°	292 - 2021		

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO

		
TEMA: PANORAMICA - 1	TEMA: PANORAMICA - 2	TEMA: PANORAMICA - 3
FOTO	FOTO	FOTO
		
TEMA: MAMPOSTERIA	TEMA: CUBIERTA	TEMA: ELECTRICO
FOTO	FOTO	FOTO
		
TEMA: RCI	TEMA: RCI	TEMA: PAÑETES
FOTO	FOTO	FOTO
		
TEMA: CALIDAD	TEMA: MATERIALES	TEMA: GRADERIAS + 4.50M



Código:	86	DEL	Fecha de Emisión:	jueves, 22 de febrero de 2024	AL	Página:	miércoles, 28 de febrero de 2024
---------	----	-----	-------------------	-------------------------------	----	---------	----------------------------------

SEMANA N°	86	DEL	Fecha de Emisión:	jueves, 22 de febrero de 2024	AL	Página:	miércoles, 28 de febrero de 2024
-----------	----	-----	-------------------	-------------------------------	----	---------	----------------------------------




FECHA INICIO :	23 de diciembre de 2021	FECHA TERMINO :	23 de septiembre de 2022
----------------	-------------------------	-----------------	--------------------------

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LAS INSTALACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL DISTRIBUIDOS ASI: FRENTE 1 - LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO DE LA ESDEGUE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU DESARROLLO QUE SERA UBICADO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO CANTON NORTE Y FRENTE II - CONSTRUCCION AULAS ESCUELA DE INFANTERIA ESINF EN EL CANTON NORTE Y FRENTE III - CONSTRUCCION DEL COMANDO PARA LA FUTAN QUE SERA UBICADO EN EL FUERTE MILITAR BUENA VISTA - GUAJIRA"						
---------------------	---	--	--	--	--	--	--




INTERVENTOR	CONSORCIO INTEROBRAS	NIT O C.C.	901.546.820-5	CONTRATO N°	295 - 2021
CONTRATISTA	CONSORCIO CENACAUDITORIO- 266	NIT O C.C.	901.544.439-2	CONTRATO N°	292 - 2021

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO		FOTO		FOTO	
------	---	------	---	------	---

TEMA:	Medidor de AGUA	TEMA:	Medidor de LUZ	TEMA:	AMBIENTAL
-------	-----------------	-------	----------------	-------	-----------

FOTO	55973	FOTO	34900	FOTO	Limpieza del Desarenador
------	-------	------	-------	------	--------------------------

		
---	---	--

TEMA:	HSE	TEMA:	HSE	TEMA:	HSE
-------	-----	-------	-----	-------	-----

FOTO	Charlas y Pausas Activas	FOTO	Orden y Aseo	FOTO	Acompañamiento de Visita Tecnica
------	--------------------------	------	--------------	------	----------------------------------
